



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 392014

Resi code: 19

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam: <u>Gemeente Ingel Munster</u>	Naam, voornaam: <u>Gemeente Ingel Munster</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Stationplein 54</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>8770 Ingel Munster</u>
	Tel.: / /

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	☒ Wooneenheid	☒ Vóór 1/10/1981
☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	☐ Werkeenheid	☒ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
☐ Controlebezoek (6.5.)	☐ Werfinstallatie	☐ Vanaf 1/06/2020
☐ Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)	☐ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
☒ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	☐ Technische lokalen van een residentieel geheel	
☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	☐ Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8: ☒ Toegepast ☐ Niet toegepast	☐ Andere installatie:	

Algemene gegevens elektrische installatie :

☐ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler Naam verd.:	EAN:	☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: <u>5039349</u>	meterstand dag: <u>9166</u>	nacht: <u>12568</u>
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 36	☐ kWh excl. nacht meter : nr.: meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ mono 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode: ☐
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: X mm ² - Type: <u>XVB</u>	Aardverbindingssyst.: ☒ TT ☐
Beschrijving installatie ☒ Zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting: <u>100</u> A / <u>30</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>
	Aantal eindstroombanen: <u>9</u>	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Verplaatsb. materieel	☒ Vast materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>115</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>1,802</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Continuïteit (equipot., PE)	☒ Test diff.		
Alg. diff.: ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☒ kan niet verzegeld worden				Schema's en plannen getekend: Ja / ☒ Nee		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken	<u>Volledig niet</u>
Nieuwe installatie	<u>I1201 I1210</u>
☐ Nihil	<u>I1301 I1501 I1603 I1606 I1704 I1218 I1914</u>
Vastgestelde inbreuken	<u>I1401 I1502 I1605 I1610 I1709 I1906 I1908</u>
Bestaande installatie	<u>I1402</u>
☐ Nihil	<u>0 1061 I1606: - deft. schakel materiaal</u>
Opmerkingen	<u>0 1062 - openstaande verdeelkasten</u>
☐ Nihil	<u>- losse draad in deuren (verl. stop...)</u>

Besluit :

☐ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

18 maanden na datum acte

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal : Handtekening


Agent bezoeker :

Naam: Jerry Maenhout Agent nr.: 5855 Datum: 6.08.2021

Bijlage(n): ☐ Situatieplan(nen): ☐ Eéndraadsschema('s): ☐

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

SO 61010508 Stationsplein 41 8770 ingelmunster:

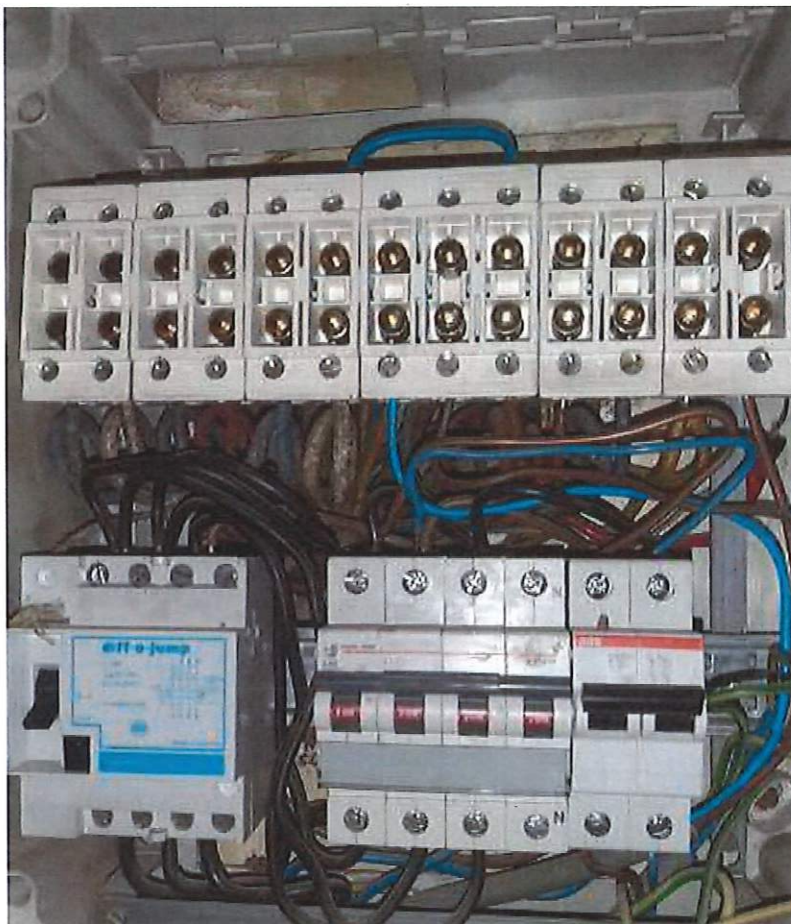

 **VINÇOTTE**
Martijn
LEROY
Inspecteur

4/08/2021
