



advenso
geeft je energie

Gistelsteenweg 475c, 8490 Jabbeke
TEL: 050/703433
www.advenso.be / info@advenso.be
Ondernemingsnummer: BE0887165661

SCHEMA PV-INSTALLATIE

INSTALLATIE-ADRES:

Luingelaanstraat 29
8870 Izegem

EAN: 541 44.....

HANDTEKENING EIGENAAR:

Amel Zoubani


STEMPEL CONTROLE-ORGANISME:



Bestaande elektrische installatie

Solarkabel (DC):

- Type: ☒ Cca
☐ Dca
☐ Eca
- Sectie: 4 mm²
- Plaatsingswijze:



Panelen:


- Aantal: 6
- Merk: Jinko
- Type: JKM 415
- Vermogen: 415 Wp
- Strings: 1x6

Omvormer(s):

- Aantal: 1
- Merk: Solis
- Type: RHI 1P3K
- P AC max: 3300 VA (totaal)
- S/N: 1031013929130311

Voedingskabel (AC):

- Type: ☒ XVB / ☐ VOB / ☐
- Sectie: 3 G 4 mm²
- Plaatsingswijze:



Datacommunicatie

Automaat

- Type:

Interne bekabeling:

6 mm²

Automaat PV-installatie:

Type: 2P20A

Remautomaat:

- Geplaatst: ☒ ja ☐ neen
- Type: 4P25A

Groenestroomteller: Productiemeter:

- Geplaatst: ☒ ja ☐ neen
- Merk: Carlo Carzzi
- S/N: 170173X
- Klasse: / MID:

Bijkomende differentieel: ☐ ja ☒ neen I_n

= A / ΔI = mA
☐ 2P / ☐ 4P

Algemene differentieel:

I_n teller = 25 A
Spanning = 3x230
I_n = 40 A / ΔI = 300 mA / Type A
☐ 2P / ☒ 4P

Weerstand R_a = Ω

INSTALLATEUR:

Advenso

Gistelsteenweg 475c

8490 Jabbeke


HANDTEKENING INSTALLATEUR:

Referentie / versie:

Datum: 14/2/2024

Datum _____

Onderwerp _____

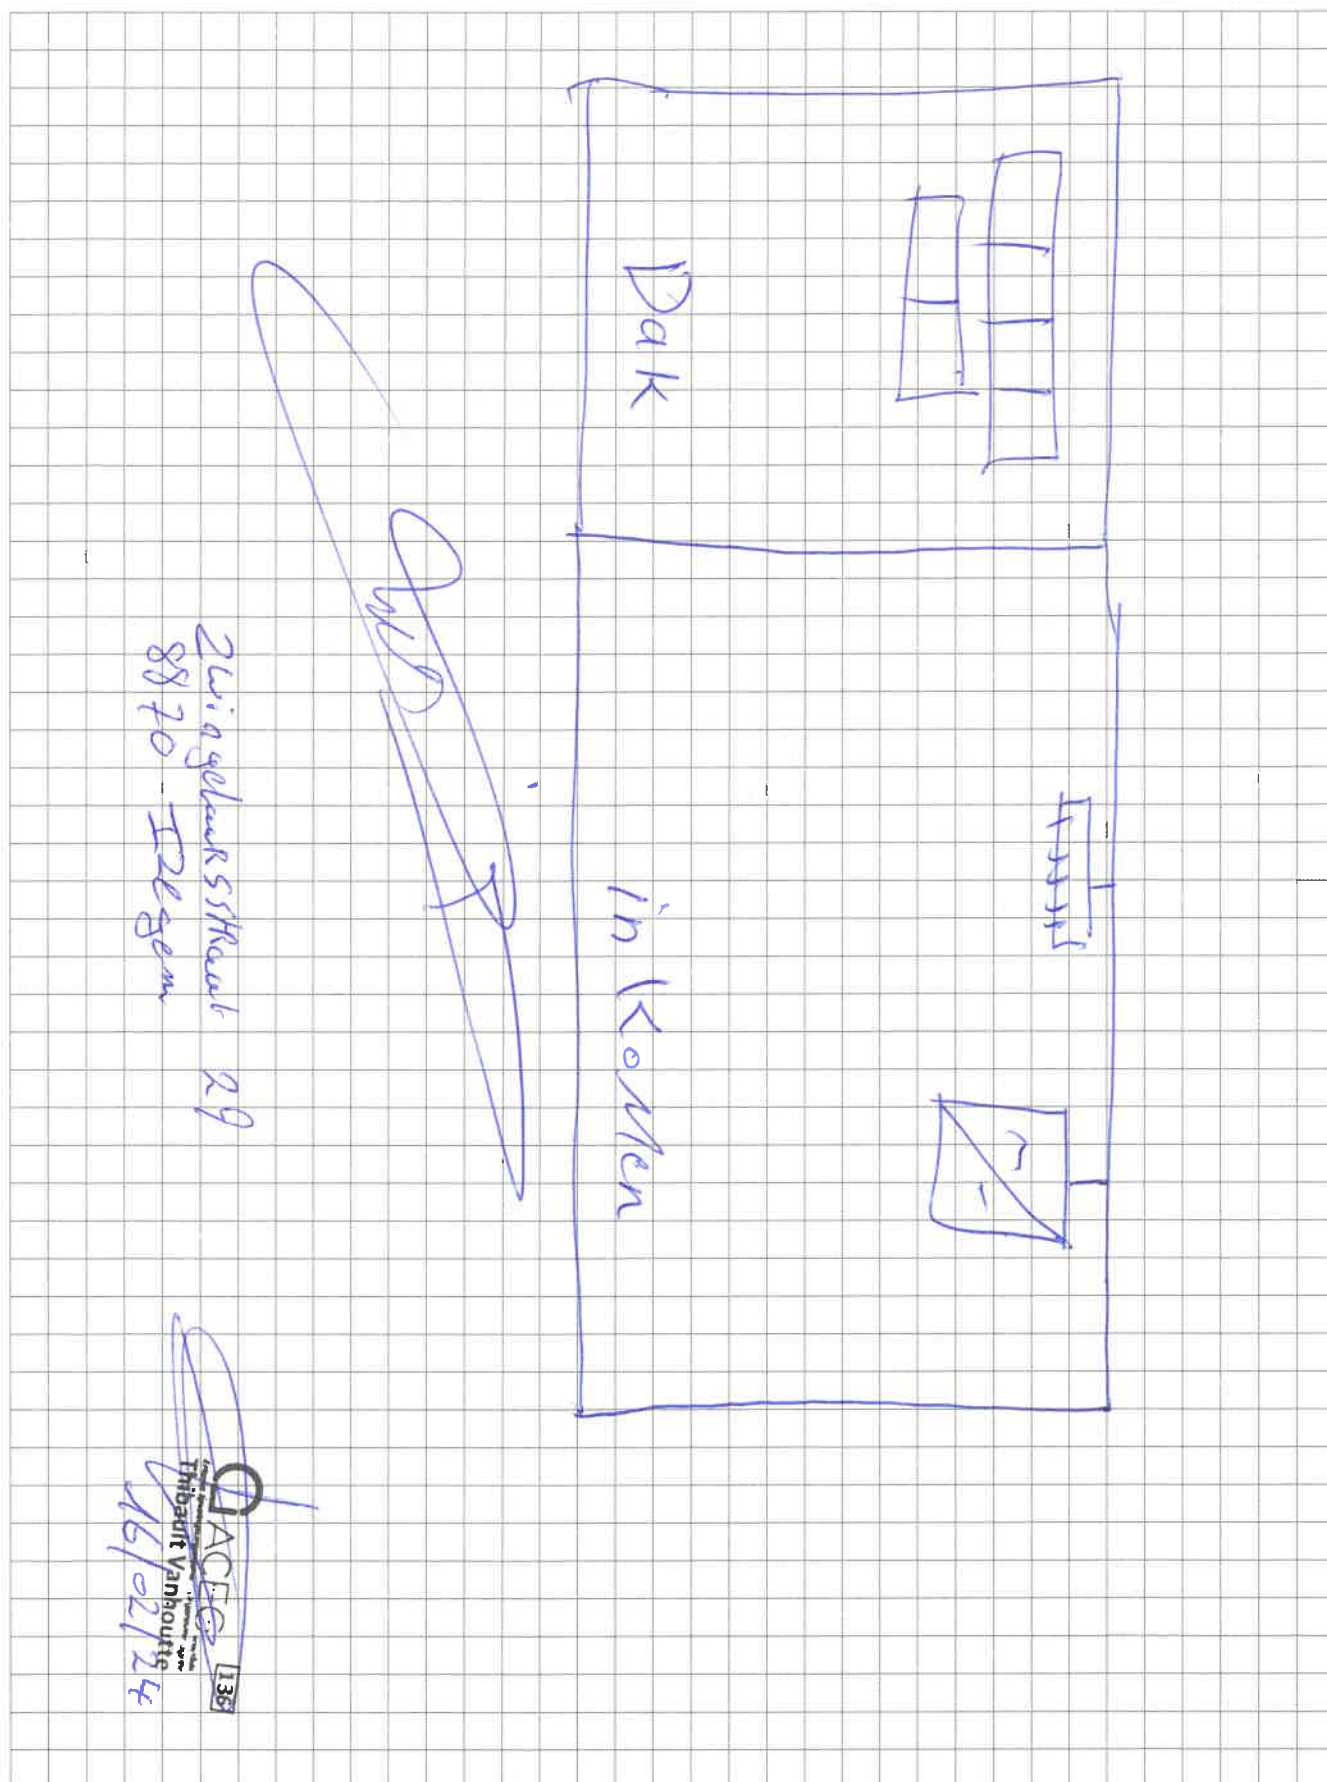

Advenso BV
BE0887165661
Adres: Marsbiebuikstraat 13
8210 Zedelgem
Tel.: 050 70 34 33
E-mail: team@advenso.be

Amal Zoubari
Zwingelaarsstraat 29
8870 Izegem

PRJ23006501 - iChoosr - Amal Zoubari

Pagina 1 / 2

FACTUUR 21711334

Datum 15/02/2024
Vervaldatum 22/02/2024
Offerte OFF238299
Externe referentie iChoosr - Amal Zoubari

Werfadres Zwingelaarsstraat 29
8870 Izegem

Beschrijving	Aantal	Excl. BTW	BTW %	Incl. BTW
Mono kristallijn paneel - JINKO JKM4I5 Full Black	6	1.495,19 €	6%	1.584,91 €
<i>Totaal 2490wp</i>				
<i>Milieubijdrage PV</i>	<i>6</i>	<i>12,00 €</i>	<i>6%</i>	<i>12,72 €</i>
TIGO 700W 15A TS4-A-O OPTIMIZATION	2	120,00 €	6%	127,20 €
Hybride omvormer - Solis Hybrid S5-EHIP3K-L	1	1.138,50 €	6%	1.206,81 €
Installatie - Organisatie - Montage	1	811,57 €	6%	860,26 €
Overig - Elektra Langere kabelroute	10	250,00 €	6%	265,00 €
Overig - Meerwerk Hoogwerker	1	595,00 €	6%	630,70 €

Groepsaankoop:

U betaalde bij inschrijving een waarborg van 150EUR. Deze waarborg wordt u terugbetaald door de groepsaankoop. U betaalt het volledige factuurbedrag.

Bedrag totaal excl. BTW	4.422,26 €
BTW 6,00%	265,34 €
Bedrag totaal incl. BTW	4.687,60 €

Mededeling bij betaling +++451/3256/12059+++

* Na ontvangst van uw betaling bezorgen wij u de documenten zodat u de aanmelding bij de netbeheerder in orde kan brengen en de premies kan aanvragen. De aanmelding dient wettelijk te gebeuren binnen 30 dagen na de keuringsdatum.

Gelieve de betaling te voldoen met vermelding van de gestructureerde mededeling op het rekeningnummer **IBAN ING: 82 3800 1957 4368** of **IBAN Belfius: BE82 0689 3424 9968**.

Advenso BV BTW BE0887165661
IBAN ING: BE82 3800 1957 4368 | IBAN BELFIUS: BE82 0689 3424 9968

Verkoopsvoorwaarden zie <https://www.advenso.be/hernieuwbare-energie/>

Wasim Mohammad

Van: Amal <amal.zoubari@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 9:53
Aan: Wasim Mohammad
Onderwerp: Fwd: Advenso - Jouw factuur - 21711334
Bijlagen: globe-10px_5833f7aa-5f2d-4225-8d46-b0f16eaae7f2.png; 21711334.pdf

U ontvangt niet vaak e-mail van amal.zoubari@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Printen

----- Forwarded message -----

From: **Keanu Maes** <Keanu@advenso.be>
Date: Thu, 15 Feb 2024, 14:34
Subject: Advenso - Jouw factuur - 21711334
To: Amal Zoubari - amal.zoubari@gmail.com <amal.zoubari@gmail.com>

Beste Amal Zoubari,

Goed nieuws. Je geniet nu van je eigen groene stroom!

Betaal je factuur

In bijlage vind je de factuur voor jouw installatie. We vragen je om de factuur binnen de 7 werkdagen te betalen. Op de factuur vind je alle details terug om de betaling in orde te brengen.

Waarborg 150EUR

Je hebt bij inschrijving 150EUR betaald op een derderekening van de groepsaankoop. Deze waarborg word je terugbetaald vanuit de groepsaankoop.

Garantiebewijzen

Via [deze link](#) kan je onder de rubriek **documenten** de garantiebewijzen terugvinden.

Installatie aanmelden bij Fluvius

Zodra we je betaling ontvangen hebben, bezorgen we je het goedgekeurd keuringsverslag, zodat je je zonnepanelsysteem kan aanmelden bij de netbeheerder Fluvius. Om je verder te begeleiden bij het aanmelden van je zonnepanelen, ontvang je na de betaling de nodige informatie en documenten van uw installatie.

Meer informatie over de groepsaankoop

Graag verwijzen we je naar [onze webpagina](#) met technische documenten, montagematerialen en datasheets.

Met vriendelijke groeten,



Keanu Maes ☎ +32 50 946 632

Project
Manager

🌐 www.advenso.be

📍 Marsbiebuikstraat 13, 8210
Zedelgem

Advenso
positive energy solutions

Advenso groeit!
Groei jij mee?
Bekijk onze vacatures:
www.positivejobs.be





~~Dr. H. H. H.~~
~~16/11/24~~

24.12.24
 8870
 11/12/24

advensio





Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/02/2024 Inspecteur: Thibault Vanhoutte Mentor: Installateur: Advenso
ID-label: B.T.W. nr. BE 0887 165 661 Klantreferentie:
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serienummer 19370727
Datum verslag: 16/02/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Zwingelaarsstraat
Huisnummer 29
Busnummer
Postcode 8870
Gemeente Izegem
Land België

Eigenaar

Naam Zoubani Amal
Straatnaam Zwingelaarsstraat
Huisnummer 29
Busnummer
Postcode 8870
Gemeente Izegem
Land België


Installateur

Naam Advenso
BTW nr. BE 0887 165 661
Telefoonnummer 050703433
E-mail carline@advenso.be

Type : PV-installatie en/of thuisbatterij
Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN 541449651000120941

Teller Nr.: 1SAG3200017363

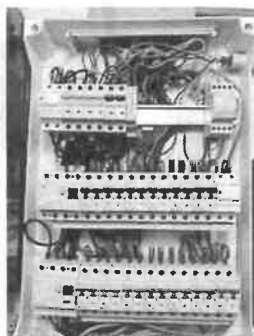

Aard onderzoek:

Geflikvormigheidscontrole van een PV installatie ≤ 10 kVA en/of thuisbatterij volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1-6.4. en 4.2.4.3 en 7.11.2. en synergrid C10/11.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023? Nee

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3-230V Meter / bord verbinding: 6 mm² Max. beveiliging: 30 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 2

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 4.14 MΩ

RE: 2.12 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beverligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Rem	C	40		4	6
Pv	C	20		2	4
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT	Eilandwerking	OK

GROENE METER

Fase	Serie Nr	Meterstand	CE markering	MID markering
3~230V	YR 2023 130173x	4.26	aanwezig	Ok

OMVORMER

Aantal: 1			
Merk: Solis	Serie: S5-EH1P(3-6)K-L	Type: S5-EH1P3K-L	Aansluitingen: 1-phase
Serienummer: 1031013229130311	Smax (VA): 3300	I AC - nom (A): 14.35	Geschik voor batterij opslag: Ja
Curve: C	IN (A): 20	UDC Max > UDC panelen/string: OK	IDC Max > I str1 + I str2 + ...: OK

FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN

Aantal	Merk	Type	Piekvermogen per stuk (Wp)	Totaal Piekvermogen (Wp)
6	Jinko	JKM415N	415	2490

THUISBATTERIJ

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld

nota/note 25 De panelen zijn niet/slecht zichtbaar & alsook niet bereikbaar.


nota/note 6 Deze controle omvat enkel de PV-installatie.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/2/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..


De inspecteur Thibault Vanhoutte




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2
Het verslag dient te worden opgesteld in het dossier van de elektrische installatie.
Een wijziging dient te worden vermeld in het dossier van de installatie.
Elk ingesloten overkomen van personen en te wijten is rechtsbreuk of onrechtvaardig, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie, dient onmiddellijk ingezonden te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De inspecteur van dit document is enkel toegelaten in zijn integraal geheel en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aannemer.
De keuring betreft slechts de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/2/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

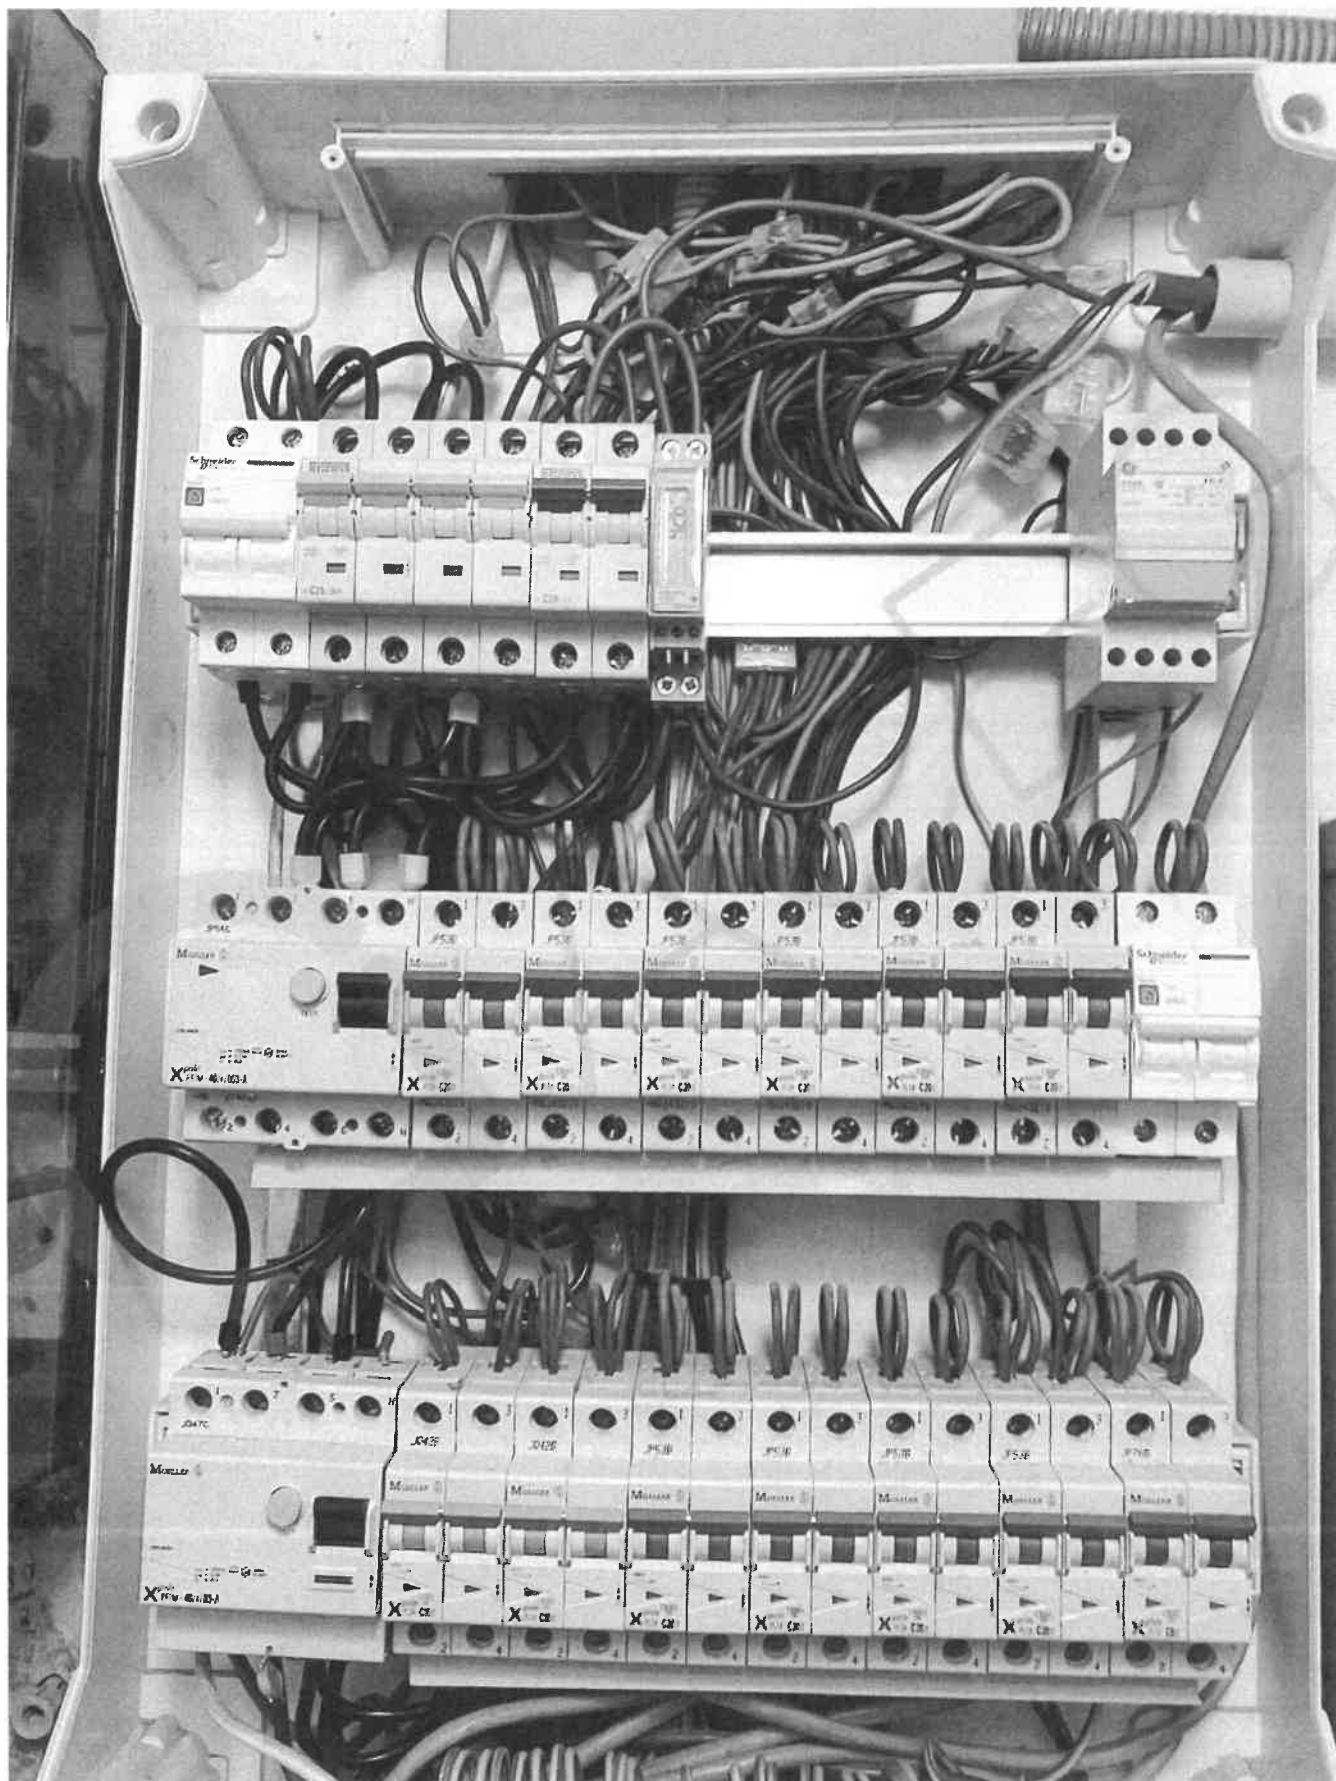




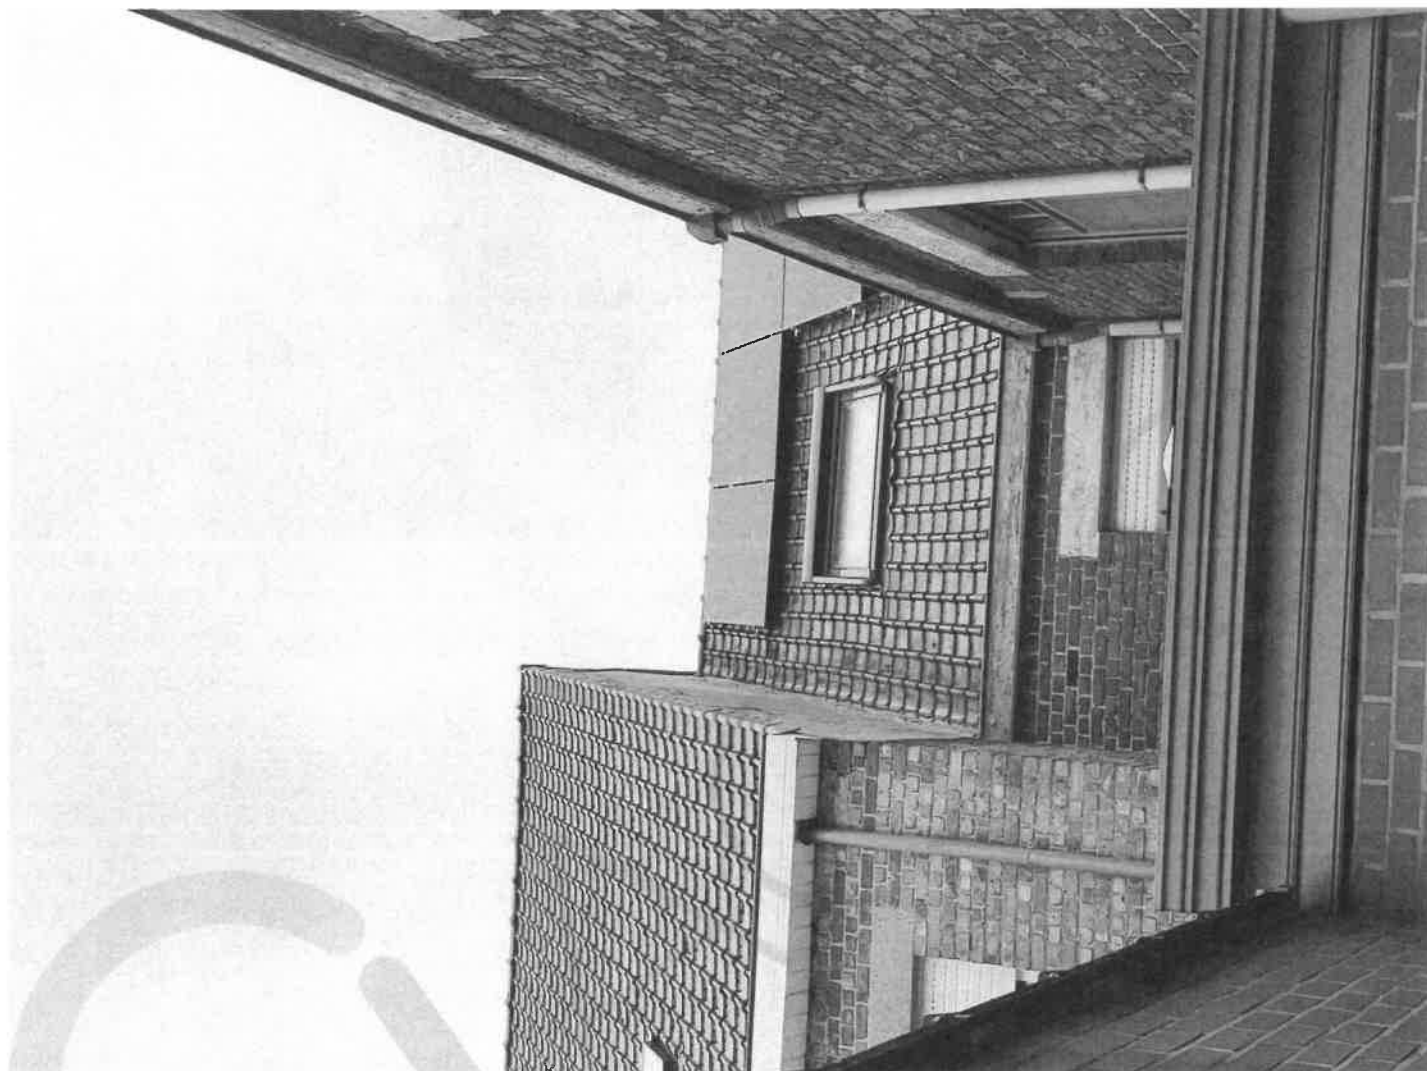

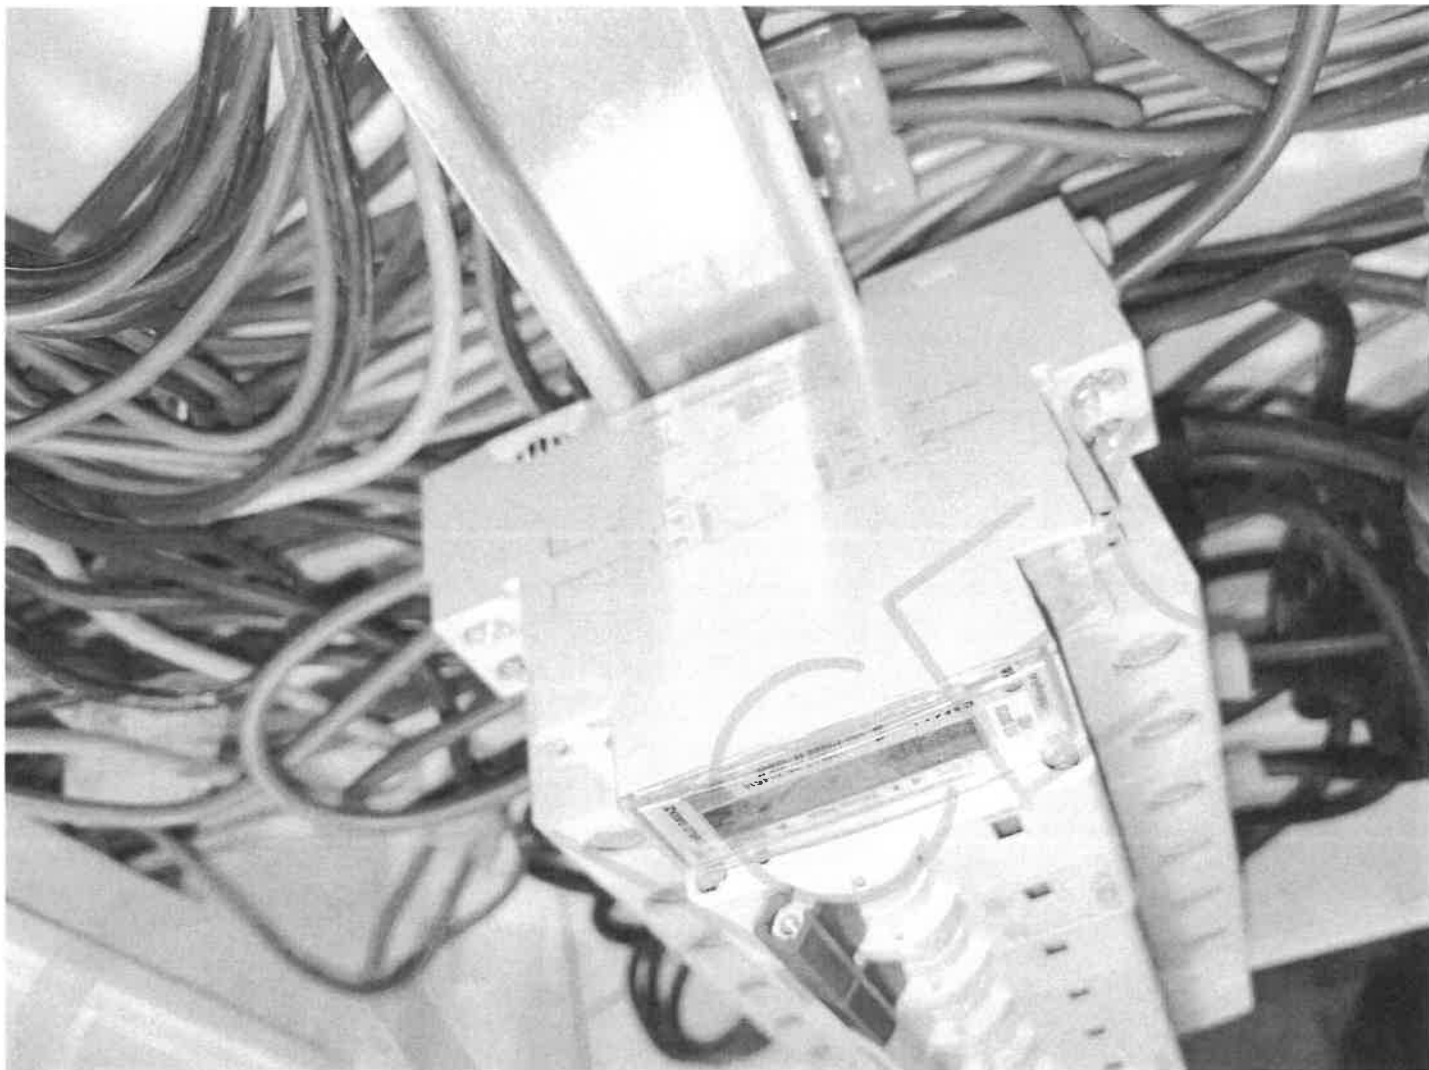

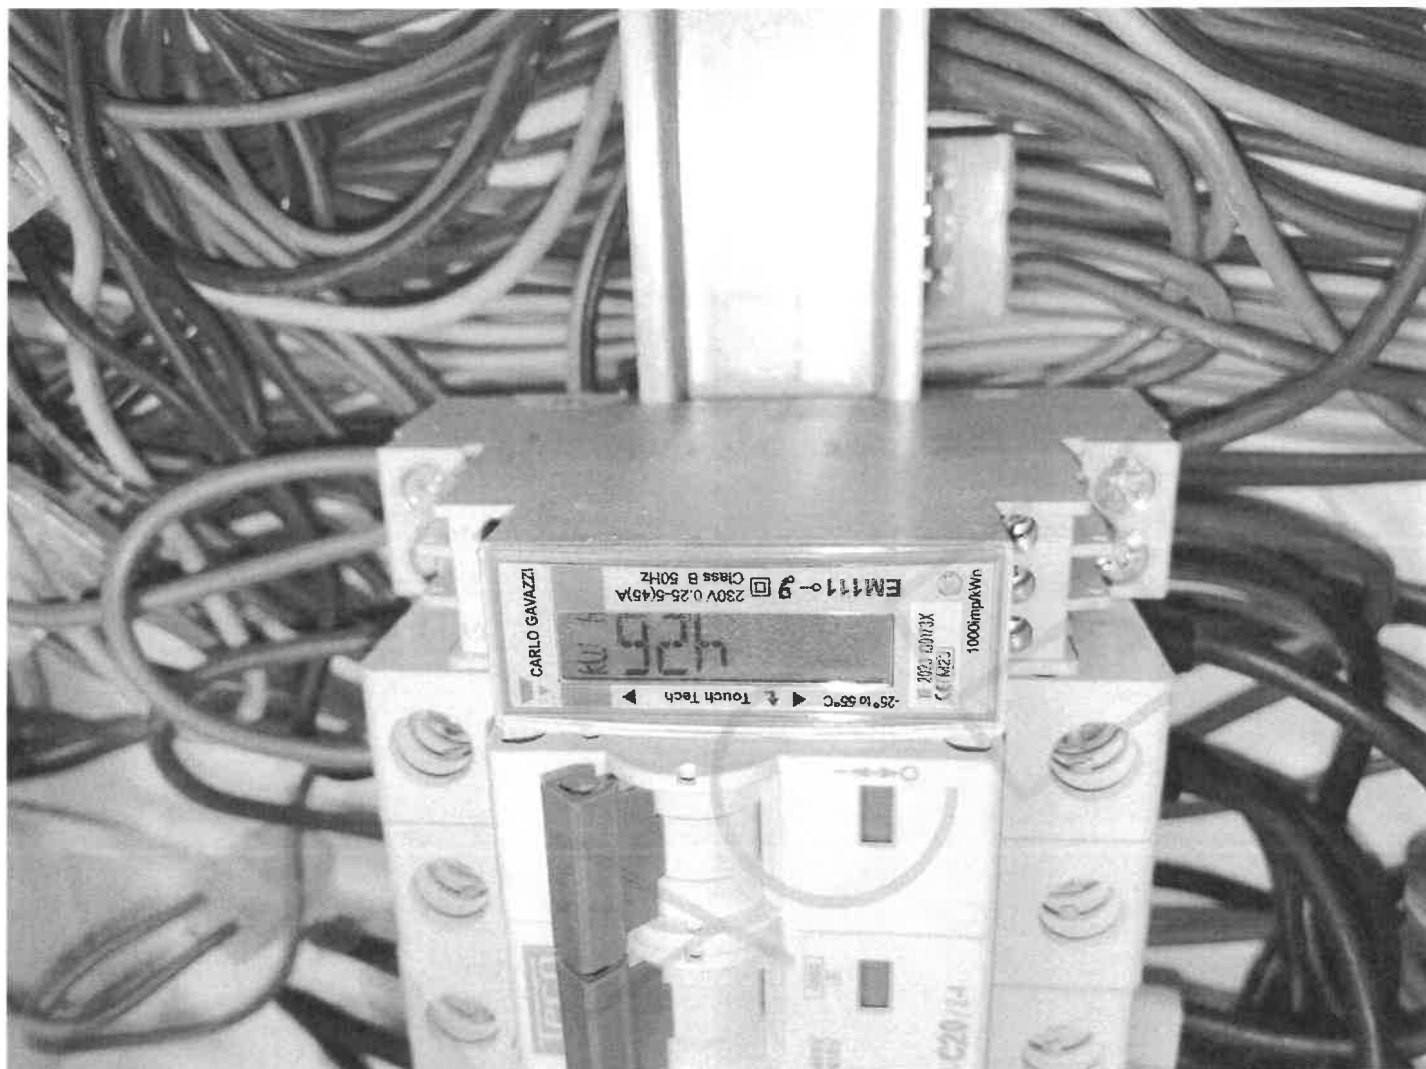


Model: S5-EH1P3K-L

PV-Input

Max. input voltage d.c.	600V
Mppt voltage range d.c.	90-520V
Max. input current d.c.	2X15A
Isc PV(absolute maximum) d.c.	2X22.5A

Battery

Battery Type	Li-Ion / Lead-acid
Battery Voltage range d.c.	42 - 58V
Max. Charge/discharge current d.c.	62.5A/62.5A

AC-Output(Back-up)

Rated apparent output power	3000VA
Rated output voltage/frequency a.c.	220V/230V, 50/60Hz
Rated output current a.c.	14 A/13.5 A

AC-Output(Grid side)

Rated output power	3000W
Max. apparent output power a.c. *(1)	3300VA*(2)
Rated output voltage/frequency a.c.	220V/230V, 50/60Hz
Max. output current a.c. *(1)	15A

AC-Input

Rated Voltage a.c.	220V/230 V
Rated Current	20.5 A/20 A
Rated Frequency	50/60 Hz

General

Protective class	I
Ingress protection	IP65
Ambient temperature	-25...+60°C
Overvoltage category	II(PV), III(MAINS)
General power factor	-0.8...1...+0.8
Inverter topology	non-isolated



*(1) rated current and rated apparent power for Australia
 S/N *(2) 3000VA for AS/NZS 4777 2 2020
 1031013229130311



Name: Ginlong Technologies Co., Ltd.
 Address: No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park,
 Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315712, P.R. China
 www.solisinverters.com

Made in China

